



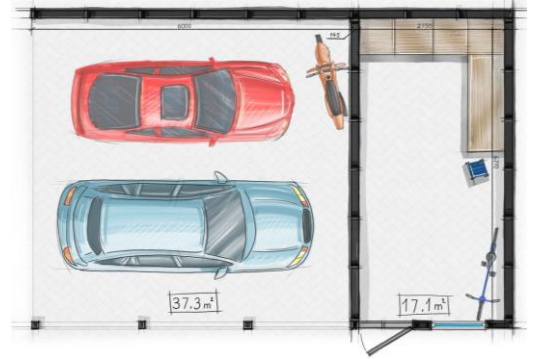
Arhitektu Inženieru Grupa

**KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA**

SIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913

"Bērzkalni", Ogres novads, Tinūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051

www.aigkonstrukcijas.lv e-pasts: info@aigkonstrukcijas.lv

Nosaukums: Nojume 54  
Piegādes adrese: 40km ap AIG ražotni Ogrē.**TĀME**  
**Nojume 54**<https://aigkonstrukcijas.lv/property/nojume-54/>

NR	DARBU UN MATERIĀLU NOSAUKUMS	KOMPLEKTĀCIJA	VIZUALIZĀCIJAS (VIZUALIZĀCIJAS IR ORIENTĒJOŠAS)
1	<b>RAŽOŠANAS DOKUMENTĀCIJA.</b>	letverts	
	Ēkas detalizētas konstrukcijas izstrāde, ražošanas dokumenti	letverts	
2	<b>ĀRSIENAS (H=2.5M)</b>	letverts	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x142mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu krāsots no abām pusēm (krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC).	letverts	
	Koka rāmis noslēgajā telpā (C24, 145 c/c~600-1200 mm) nekrāsots, neimpregnēts	letverts	
	Koka rāmis kolonnas, pasijas nojumes atvērtajā daļā (C24, 145 c/c~600-1200 mm) krāsots: (krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC).	letverts	
	Kolonnas 3 gab., pasija 1 gab., nojumes atvērtajā daļā. Krāsots: (krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC).	letverts	
	Hidroizolācija (PE, 0,2mm) paneļu apakšā	letverts	
	PVC logs (1 gab.) ar 3 stiklu paketi, rāmja krāsa no iekštelpas balta (RAL9016) rāmis no ārpusē krāsā RAL7016	letverts	
	Vasarīcu durvis 458 Swedoor (880x2078mm) - krāsotas RAL7016	letverts	
	Logu un durvju blīvējums (poliuretāna putas, bez papildus lentām)	letverts	
	Ārējās skārda palodzes (krāsa, RAL 7016)	letverts	
	Logu un ārdurvju ailu iekšējā apdare (koka uzlikas - fasādes dēlis, nekrāsots)	letverts	
	Logu un ārdurvju ailu ārējā apdare (dēļi 18x58mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC).	letverts	
Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120-145mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC)	letverts		
Paneļu, kolonnu, pasijas montāžas elementi	letverts		
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts		
3	<b>ĀRSIENAS BĒNIŅU TESPĀ ( 3 gab.)</b>	letverts	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x142mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC).	letverts	
	Koka rāmis (neapstrādāts)	letverts	
	Montāžas elementi	letverts	
4	<b>JUMTA KONSTRUKCIJA UN GRIESTU KONSTRUKCIJA.</b>	letverts	
	Jumta seguma komplekts Elegānt (klasika), Cesar 55/HDX, krāsa RAL7016, ( Balex metal Vidzeme SIA)	letverts	
	Lietus ūdens notek sistēmā ar apajām tehnēm un notekām , krāsa RAL7016	letverts	
	Sniega barjera uz jumta atvērtās nojumes daļā, (cauruļveida L=9m), krāsa RAL7016	letverts	
	Telpiska difūzijas membrāna ar paaugstinātu izturību	letverts	
	Jumta plaknes un ēkas dzegļu apšuves dēļi (18x120mm taisnstūrveida, ar smalki zāģētu fasādes virsmu, krāsoti (krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC).	letverts	
Jumta nesošās konstrukcijas (divslīpņu kopnes, krāsots: krāsas tonis Tikurilla 5130 KELO ARTIC).	letverts		
Montāžas elementi jumtam un griestiem	letverts		
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts		
5	<b>RŪPNĪCAS KOMPLEKTA PIEGĀDE</b>	letverts	
	Piegāde līdz būvlaukumam 40km ap AIG ražotni Ogrē.	letverts	
6	<b>RŪPNĪCAS KOMPLEKTA MONTĀŽA</b>	letverts	
	Tiks samontēts viss, kas ir ietverts rūpnīcas komplektā. Cena norādīta montāžai 40km ap AIG ražotni Ogrē.	letverts	
<b>RŪPNĪCAS KOMPLKETS AR PIEGĀDI UN MONTĀŽU:</b>		<b>33516.92</b>	<b>EUR ar PVN</b>
