Arhitektu Inženieru Grupa

KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA

SIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913

"Bērzkalni", Ogres novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051

www.aigkonstrukcijas.lv e-pasts: info@aigkonstrukcijas.lv

Nosaukums : "Studio 51 ".

Adrese: attālumā līdz 40km apkārt Ogrei

Ēkas iekštelpu grīdas laukums: ~48.8 m2

Tēme izstrādāta: 01.07.2026.

TĀME

" STUDIO 51 " (BRĪVDIENU MĀJA ar iekšējo pelēko (ģipškartona) apdari)












Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Komplektācija	Vizualizācijas, Visualization (vizualizācijas ir orientējošas)
1	**Projektēšanas un konstruēšanas darbs.**	letverts	
	Ēkas ražošanas dokumentācijas detalizāciju izstrāde, ražošanas dokumenti.	letverts	
2	**Grīdas panelis**	letverts	
	OSB-3 plāksne 22mm (grīdai)	letverts	
	Tvaiku izolācija (PE, 0,2mm)	letverts	
	Koka rāmis (C24, 245x45 c/c~600 mm)	letverts	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 245 mm, λ=0,036 W/mk)	letverts	
	Pretvēja izolācijas plēve 130g/m2	letverts	
	OSB-3 plāksne 10mm no apakšpuses un metāla siets	letverts	
	Cinkots siets 5x5mm	letverts	
	Blīvējošā lenta (Isover SKC-20) starp paneļiem	letverts	
	Dēļu apšuvums cokolam **500mm** (horizontāls dēlis ar pusspundi UTV, 18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots **RAL9004**) stiprināts ar cinkotām naglām, bez galviņu piegrāsošanas.	letverts	
	Paneļu montāžas elementi	letverts	
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	letverts	
3	**Ēkas ārsienas**	letverts	
	Dēļu apšuvums (vetrikāli dēlis ar pusspundi UTV, 18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots **RAL9004**) stiprināts ar cinkotām naglām vai skrūvēm, bez galviņu piegrāsošanas.	letverts	
	Latojums vertikāli (impregnēts 32mm)	letverts	
	Latojums horizontāli (impregnēts 32mm)	letverts	
	Pretvēja plāksne Gyproc GTS 9	letverts	
	Koka rāmis (C24, 195mm)	letverts	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate, λ=0,036 W/mk, 195 mm)	letverts	
	Latojums (horizontāli 45mm)	letverts	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate, λ=0,036 W/mk, 45 mm)	letverts	
	Tvaika izolācija (PE, 0,2 mm)	letverts	
	OSB-3 plākšņu apšuvums, 1 slānī (12 mm)	letverts	
	Ģipškartona plākšņu apšuvums, 1 slānī (Norgips GKB 12,5 mm)	letverts	
	Starppaneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	letverts	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	letverts	
	Logu komplekts . PVC Gealan 9000; Uvid~0,8 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krās no ārpuses **RAL9005** no iekštelpas **Balts**.	letverts	
	Ārurvis 1 gab. (SWEDOOR ECO Function Brahms, krāsa **NCS S 9000-N**, parasts stikls)	letverts	
	Logu briestošā lenta (greenteQ montāžas lenta OMNIA BG1 73/6-20 antracīts)	letverts	
	Ārējās skārda palodzes, krāsa **RAL9005**	letverts	
	Iekšējā palodze PVC vai kokskaidu palodze (krāsa **Balta**)	letverts	
	Logu un ārdurvju aiļu iekšējā apdare (ģipškartons 12,5mm)	letverts	
	Dēļu apdare logiem un durvīm no ārpuses (dēlislis 18x58-120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots **RAL9005**) stiprināts ar cinkotām naglām vai skrūvēm, bez galviņu piegrāsošanas.	letverts	

	Skārda lēseņi virs logiem un durvīm krāsa **RAL9005**	Ietverts
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120-145mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots **RAL9005**) stiprināts ar cinkotām naglām vai skrūvēm, bez galviņu piegrāsošanas.	Ietverts
	Gaisa ieplūdes vārsti sienās VTK 100 (4 gab.)	Ietverts
	Paneļu montāžas elementi	Ietverts
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	Ietverts
4	**Ēkas ārsienas bēniņu daļā**	Ietverts
	Dēļu apšuvums (vetrikāli dēlis ar pusspundi UTV, 18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots **RAL9004**) stiprināts ar cinkotām naglām vai skrūvēm, bez galviņu piegrāsošanas.	Ietverts
	Latojums impregnēts 32mm)	Ietverts
	Pretvēja membrāna	Ietverts
	Koka rāmis, kopne	Ietverts
	Koka vienviru durvis (koka rāmis ar dēļu apdari un aizbīdni, fasādes krāsā)	Ietverts
	Ārējās skārda lāsenis, krāsa **RAL9005**	Ietverts
	Paneļu montāžas elementi	Ietverts
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	Ietverts
5	**Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 95mm)**	Ietverts
	Ģipškartona plākšņu apšuvums, 1 slānī no vienas puses (Norgips GKB 12,5 mm)	Ietverts
	OSB-3 plākšņu apšuvums, 1 slānī no vienas puses (12 mm)	Ietverts
	Koka rāmis (95-195x45 c/c~600 mm)	Ietverts
	Sķaņas izolācija starp koka rāmi (minerālvate, λ=0,036 W/mk, 50 mm)	Ietverts
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	Ietverts
	OSB-3 plākšņu apšuvums, 1 slānī no otras puses (12 mm)	Ietverts
	Ģipškartona plākšņu apšuvums, 1 slānī no otras puses (Norgips GKB 12,5 mm)	Ietverts
	Starppaneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	Ietverts
	Paneļu montāžas elementi	Ietverts
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	Ietverts
6	**Jumta konstrukcija ar horizontālu griestu konstrukciju**	Ietverts
	Jumta seguma komplekts (profils ELEGANT 25/510mm, ar rievām, 0.50mm krāsa **RAL9005** . Balex metal Vidzeme SIA)	Ietverts
	Lietus ūdens notek sistēma ar apaļām teknēm un notekām , krāsa **RAL9005**	Ietverts
	Sniega barjera uz jumta (cauruļveida), krāsa **RAL9005**, L=10.3m	Ietverts
	Ventilācijas izvadi virs jumta (3 gab. komunikāciju stāvvadamiem, krāsa **RAL9005**)	Ietverts
	Šķērslatojums virs spārēm (32mm, impregnēts, c/c=500mm)	Ietverts
	Garenlatojums virs spārēm (32 mm, impregnēts)	Ietverts
	Difūzijas membrāna virs kopnēm (210 g/m2)	Ietverts
	Jumta nesošās konstrukcijas (koka spāres C24, H=340mm, sniega slodze Sk=150kg/m2)	Ietverts
	Siltumizolācija starp spārēm (minerālvate, λ=0,40 W/mk) 300mm	Ietverts
	Plākšņu aizdares starp spārēm, siltumizolācijas noturēšanai	Ietverts
	Tvaika izolācija (PE, 0,2 mm)	Ietverts





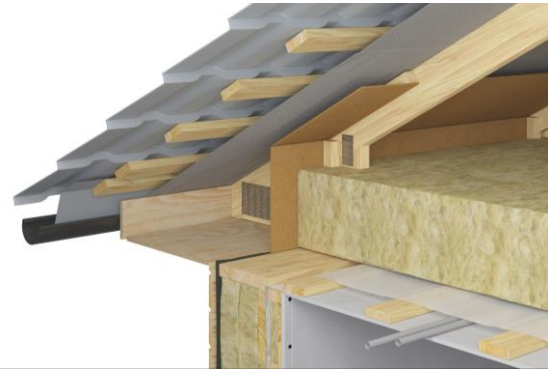

	Tvaika izolāciju līmējošā līmlente	Ietverts	
	Retināts latojums griestiem (30mm, c/c~400mm)	Ietverts	
	Ģipškartons pie griestu latām (Norgips GKB 12,5 mm)	Ietverts	
	Dzegas apšuvums (dēlis 18x120-140mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots **RAL9005**) stiprināts ar cinkotām naglām, bez galviņu piegrāsošanas.	Ietverts	
	Montāžas elementi jumtam un griestiem	Ietverts	
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	Ietverts	
7	**Aprīkojums dūmvadam**	Ietverts	
	Koka izmijas starp kopnēm	Ietverts	
8	Kopā :	41157.94	EUR bez PVN
	Materiālu sagāde, produkcijas iekraušana, ražošanas vadība:	1234.74	EUR bez PVN
	Kopā bez PVN :	42392.68	EUR bez PVN
	PVN (21%) :	8902.46	EUR
	Rūpnīcas komplkets kopā :	**51295.14**	**EUR ar PVN**

Papildus piedāvājumi:

1	**PIEGĀDE:** Rūpnīcas komplekta piegāde līdz būvlaukumam attālumā līdz 40km apkārt Ogrei	2299.00	EUR ar PVN.
2	**MONTĀŽA:** Rūpnīcas komplekta montāža attālumā līdz 40km apkārt Ogrei	7856.18	EUR ar PVN. 
3	**PAMATI -KOMUNIKĀCIJAS**: Stabveida pamatu izbūve ar inženiertīklu izvaidem (kanalizācijas caurules -ūdens vads līdz 10m ārpus ēkas, elektroievas līdz 20m ārpus ēkas)	4945.07	EUR ar PVN. 

VISS KOPĀ: 66395.39 EUR ar PVN.
